



Tisková zpráva

Název akce:	III/27932 Markvartice – Rakov – Střevač, II. sekce III/27932 Markvartice - Rakov
--------------------	---

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu silnice III. třídy, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace, čehož bylo dosaženo.

- Popis předmětu veřejné zakázky

I. Sekce (2018)

Stavba III/27932 Markvartice – Rakov – Střevač obnovila stávající kryt z penetračního makadamu s nátěrem silnice III/27932 v rámci souvislé údržby v úseku od středu obce Rakov v místě křižovatky se silnicí III/28010, dále pak přes obec Batín směrem na obec Střevač v délce 4,446 km, až do křižovatky se silnicí III/28012 (odbočka na obec Střevač). Silnice je nekategorijní šířky. Nejvíce přibližuje kategorii S6,5/50 s šířkou asfaltového krytu od 4,5 do 5,0 m. Ve směrových obloucích je komunikace rozšířena. Směrové, výškové a šířkové uspořádání silnice zůstalo stávající. Došlo k nadvýšení nivelety o 90mm. Obnova krytu byla provedena nadvýšením v tloušťce 90mm včetně případných lokálních vyrovnávek a sanací konstrukčních vrstev vozovky, dále byly obnoveny nezpevněné krajnice ze štěrkodrti, obnovení odvodnění pročištěním příkopů, propustků a vpustí, byly obnoveny některá čela propustků a uliční vpustí.

II. sekce (2019)

III/27932 Markvartice – Rakov stavby III/27932 Markvartice – Rakov - Střevač řešila rekonstrukci silnice III/27932 v rámci souvislé údržby v úseku od středu obce Markvartice až do středu obce Rakov. II. sekce stavby navázala na I. sekci III/27932 Rakov – Střevač, která byla provedena v roce 2018.

Rekonstrukce spočívala v obnově stávajícího krytu z asfaltového betonu v intravilánu a penetračního makadamu s nátěrem v extravilánu silnice III/27932 v rámci souvislé údržby. Silnice je nekategorijní šířky, nejvíce se přibližuje kategorii S 6,5/50 s šířkou asfaltového krytu od 5,0 do 6,0 m. Ve směrových obloucích je komunikace rozšířena až na 7,5 m. Směrové, výškové a šířkové uspořádání silnice zůstává stávající. Došlo k nadvýšení nivelety o 90 mm v km 0,165-1,753. Obnova krytu byla provedena obnovou asfaltového betonu v km 0,000-0,165 v tl. 90 mm a ve zbytku úseku v km 0,165-1,753 nadvýšením v tloušťce 90 mm včetně lokálních vyrovnávek a sanací konstrukčních vrstev vozovky, dále byly obnoveny nezpevněné krajnice ze štěrkodrti. Odvodnění bylo zajištěno pročištěním příkopů, propustků, vpustí a obnovením vybraných propustků včetně čel. Součástí stavby byla dopravně inženýrská opatření pro převedení veřejné dopravy a linkových autobusů po objízdě trase, jelikož práce byly prováděny za úplné uzavírky daného úseku komunikace.



Stavba byla rozdělena na následující stavební objekty:

- SO 001 – všeobecné a předběžné položky
- SO 101 – oprava silnice III/27932
- SO 151 – dopravně inženýrská opatření

- Termíny provedení stavby:

Souhrn smluvních dohod ze dne: 3. 7. 2018

I. Sekce stavby (2018)

Datum zahájení prací I. sekce: 9. 7. 2018

Termín ukončení stavebních prací I. sekce: 30. 9. 2018

Termín dokončení stavby I. sekce: 11. 11. 2019

Doba realizace výstavby I. sekce: 12 + 6 = 18 týdnů

II. Sekce stavby (2019)

Datum zahájení prací II. sekce: 3. 6. 2019

Termín ukončení stavebních prací II. sekce: 4. 8. 2019

Termín dokončení stavby II. sekce: 15. 9. 2019

Doba realizace výstavby II. sekce: 9 + 6 = 15 týdnů

- Financování veřejné zakázky: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy

- Náklady I. sekce stavby (2018): 22 442 666,13 Kč včetně DPH
- Náklady II. sekce stavby (2019): 13 082 162,22 Kč včetně DPH
- Celkové náklady na stavbu: 35 524 828,35 Kč včetně DPH


- Zhotovitel stavby: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129
470 01 Česká Lípa

- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

- Projektant stavby: MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

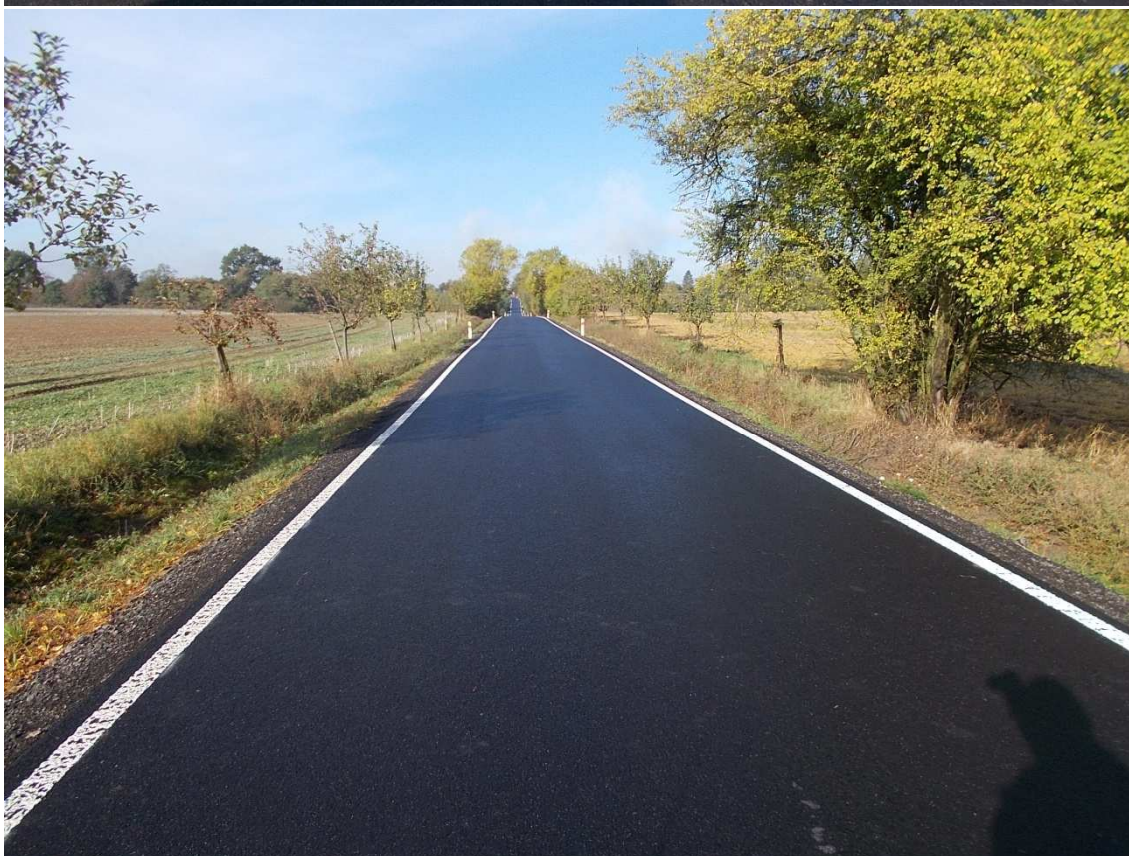



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

